



PLAN **RECONSTRUYE
VALLADOLID**

PROGRAMACIÓN Y AFECCIONES DE OBRAS EN ESPACIO PUBLICO 2024



OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE

El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de planificación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de gran envergadura.

A tal fin, dicho instrumento contempla:

- Elaboración de un programa anual publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las menores molestias.
- Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña de conservación y renovación de asfalto concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones de reurbanizado en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)
- Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades económicas en general y los vecinos de las zonas en obras.
- Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados de los posibles retrasos en las ejecuciones de las obras ofreciendo información a todos ellos para proceder, en su caso, al trámite de quejas, sugerencias o reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

www.valladolid.es

CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

ENTIDAD	CANAL DE CONTACTO	
	telefono	correo-e
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	010 983 100 105	iqs@ava.es
EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)	900 345 128	usuarios@aquavall.es
SOMACYL - RED DE CALOR-	983 362 888	acometidasredesdecalor@somacyl.es



RELACIÓN DE ACTUACIONES

TIPO DE ACTUACIÓN	IMPORTE GLOBAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)	NÚM DE ACTUACIONES
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	14.190.097,20 euros	17 actuaciones
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	9.875.000,00 euros	132 actuaciones (incluyendo 83 actuaciones en campaña de reasfaltado)
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA	29.934.451,51 euros	5 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO	660.219,00 euros	2 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL "AGUA DE VALLADOLID" (AQUAVALL)	7.937.500,00 euros	18 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)	-FASE VILLA DEL PRADO	3 actuaciones
	-FASE PARQUESOL ÁREA 1	8 actuaciones
	-FASE PARQUESOL AREA 2	9 actuaciones
	-FASE PARQUESOL AREA 3	14 actuaciones
	-FASE PARQUESOL AREA 4-	4 actuaciones
	-FASE 6-7-8.2 (LICITACIÓN)-	3 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO	3.368.574,36 euros	1 actuación
TOTAL	85.592.172,13 euros	216 actuaciones



ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	CARRETERA DE LAS ARCAS REALES	URBANIZACIÓN COMPLETA	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO		PEATONAL Y RODADA	TOTAL	PPOR VÁZQUEZ MENCHACA	BUS	ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
2	PARQUE DEL MEDIODÍA DE PARQUESOL	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	MAYO	3,5 MESES	PEATONAL				BAJO
3	JUAN CARLOS I	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	MAYO	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE PARCIAL			ALTO
4	CALLE VELETA (ENTRE CONTIENDAS Y PLAZA PORTICADA)	IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO	MAYO	9 MESES	PEATONAL	CORTE TOTAL	SIN DESVIO		BAJO
5	PLAZA RAFAEL CANO-CALLE SALUD	IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO	MAYO	7 MESES	PEATONAL	SIN CORTE	SIN DESVIO		BAJO
6	POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	MAYO	11 MESES	PEATONAL Y RODADO	CORTE ACERA Y UN CARRIL	SIN DESVIO		MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
7	PASEO ISABEL LA CATÓLICA	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	JUNIO	7 MESES	PEATONAL	SIN CORTE	SIN DESVIO		MEDIO
8	MIESES	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	JUNIO	4 MESES	PEATONAL				BAJO
9	LA OVERUELA	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	JUNIO	4 MESES	PEATONAL	CORTE PISTA ACTUAL	SIN DESVIO		MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
10	PUENTE DE PONIENTE (ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y GLORIA FUERTES)	REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE	OCTUBRE	12 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	PUENTE ISABEL LA CATÓLICA	BUS	ALTO



11	CALLE ERAS-AVDA GIJÓN	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	OCTUBRE	8 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y CALZADA	POR ACERA OPUESTA		ALTO
----	-----------------------	--	---------	---------	-------------------	-----------------------	-------------------	--	------

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
12	JUAN CARLOS I	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS	NOVIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE PARCIAL	SIN DESVÍO		MEDIO
13	PASEO JARDÍN BOTÁNICO	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MIGUEL DELIBES EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE FUENTE EL SOL Y MADRESELVA	NOVIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE PASEO OBREGÓN	BUS CENTRO SALUD	ALTO
14	MANUEL SILVELA	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP TIERNO GALVÁN EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE JUAN MARTÍNEZ VILLER GAS Y HERNANDO DE ACUÑA.	NOVIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	SIN DESVÍO		ALTO
15	DON SANCHO Y LA MERCED	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO IES LA MERCED	NOVIEMBRE	1 MES	PEATONAL	CORTE PARCIAL	SIN DESVÍO		MEDIO
16	MORENA	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MARIA TERESA IÑIGO DE TORO	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADO	CORTE PARCIAL	POR CALLE ERAS Y MIESES	BUS	ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
17	CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL)	EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE	DICIEMBRE	3 MESES	PEATONAL				BAJO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN DEL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 14.190.097,20 euros



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	GRANJA - CURVADA	2ª RAMPA EN CONTINUIDAD CON LA 1ª YA EJECUTADA. COMPLETAR ITINERARIO ACCESIBLE	EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL		PEATONAL	CORTE TOTAL	POR CALLE CURVADA		BAJO
2	DEPÓSITO	REURBANIZACIÓN COMPLETA, ENSANCHE ACERAS, ELIMIN. 1 LÍNEA APARC.(ESPANTA A J. Mª. JALÓN)	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	SIN DESVIO		MEDIO
3	ESPANTA	RENOVACIÓN DE LA ACERA LADO VADOS	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	SIN DESVIO		MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
4	FLAMENCO + OCA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, ENSANCHE DE ACERAS, SE PIERDEN APARCAMIENTOS	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO		PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO	VADOS (CORTE POR TRAMOS)	MEDIO
5	OBREGÓN	REPARACIÓN ACERA LLEVANTADA RAÍCES + ENSANCHE PARTERRES + CAMINOS (Nº 14-TR. C. SÁNCHEZ)	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO		PEATONAL	CORTE TOTAL ACERA	POR ACERA OPUESTA	VADOS, POLICIA AMBULATORIO ASPRONA	MEDIO
6	PUENTE JUAN DE AUSTRIA	SUSTITUCIÓN DE IMPOSTAS ROTAS Y/O DESPRENDIDAS. SELLADO DE FILTRACIONES A LA ESTRUCTURA	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO		PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES DE ACERAS Y CALZADA	POR ACERA OPUESTA		MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
7	MÚLTIPLES VIALES EN TODA LA CIUDAD (según desglose adjunto)	CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC)	ABRIL	5 MESES	RODADA	CORTE CALZADAS PERIODOS BREVES	POR VIARIO ADYACENTE	TRÁFICO GRAL., VADOS, BUS...	ALTA
8	SENDA SALVE REGINA	REURBANIZACIÓN COMPLETA DE JÚPITER A SATURNO	ABRIL	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE PERPENDICULAR	VADOS	MEDIO
9	PENITENCIA	ENSANCHE / RENOVACIÓN DE ACERAS (Nª SRA. - AV. PALENCIA)	ABRIL	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLES SAN PEDRO Y QUEBRADA	VADOS	ALTO
10	TÓRTOLA	REPARACIÓN ACERA + PARTERRE+ RECORTE CALZADA., LADO ANTIGUO M. CENTRAL (CIGÜEÑA - J.C. I)	ABRIL	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL ACERAS Y UN CARRIL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO



11	ESTACIÓN DE ARIZA	ACERA DE C/ AZUCARERA A FF.CC.ARIZA.	ABRIL	2 MESES	PEATONAL	CORTE ACERA	ACERA OPUESTA		BAJO
12	ÁLAMOS	PEQUEÑO TRAMO SIN ACERA	ABRIL	1 MES	PEATONAL	CORTE ACERA	SIN DESVÍO		BAJO
13	AMOR DE DIOS	REFORMA DE OREJAS CON OLMO Y AVENIDA DE PALENCIA	ABRIL	1 MES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL ACERAS	SIN DESVÍO		MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
14	M. SUANCES - ALPUJARRAS	URBANIZACIÓN PLAZA - ZONA VERDE M. SUANCES - C. ARTECHE - ALPUJARRAS - SERENA	MAYO	2 MESES	PEATONAL	PARCIAL PEATONAL	SIN DESVÍO	---	BAJO
15	DR. QUEMADA (TRAS N.A.C.)	RECONSTRUCCIÓN Y ENSANCHE ACERA TRASERA VIVIENDAS N. A. CORTÉS, SANEAMIENTO, MURO	MAYO	3 MESES	PEATONAL	CORTE ACERA	POR CALLE NARCISO A. CORTÉS		BAJO
16	FUENTE EL SOL	REBAJES - OREJA NUEVO PASO PEATONES A LA ALTURA DEL Nº 2	MAYO	1 MES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL ACERAS	SIN DESVÍO	BUS	ALTO
17	COINVASA	REURBANIZACIÓN ACERA + MEDIA CALZADA (LADO PAR). HUNDIMIENTO GENERALIZADO	MAYO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE S. SEBASTIAN Y NUEVO VIAL APARCAM.	VADOS	MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
18	SALUD	RENOVACIÓN ACERA VIVIENDAS ENTRE LOS Nº 24 Y 30	JUNIO	2 MESES ^o	PEATONAL	ACERA	ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
19	SALVIA	RECONSTRUCCIÓN VARIOS TRAMOS DE CALZADA DE HORMIGÓN	JUNIO	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL CALZADA	POR CALLES MUÉRDAGO Y JACINTO	VADOS	BAJO
20	CASA ALEGRE (INTERIOR)	PAVIMENTACIÓN PLATAFORMA ÚNICA CALLEJÓN INTERIOR	JUNIO	1 MES	PEATONAL	CORTE TOTAL	SIN DESVÍO		BAJO
21	MIRABEL	RENOVACIÓN DE ACERAS (DE STA. TERESA A S. NICOLÁS)	JUNIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y UN CARRIL	POR ACDERA OPUESTA	VADOS RESIDENCIA ANCIANOS JCYL	ALTO
22	CAMINO LAGAR DE HOYOS	DRENAJE Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DEL PASO INFERIOR BAJO VA 20	JUNIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES DE ACERAS Y CALZADA	POR ACERA OPUESTA		MEDIO



	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
23	GARCÍA VALLADOLID	REURBANIZACIÓN COMPLETA	JULIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	POR C/ FERROCARRIL	VADOS	MEDIO
24	SERRANO + FRENTE IGLESIA	REURBANIZACIÓN COMPLETA (SERRANO + ACERA FRENTE IGLESIA)	JULIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE CABALLERO Y PZA DR QUEMADA		BAJO
25	BURGOS	CARRIL BICI DE POLICÍA MUNICIPAL A COINVASA	JULIO	2 MESES	PEATONAL	CORTE PARCIAL ACERA	SIN DESVÍO	VADOS BUS POLICIA	BAJO
26	PEÑA DE FRANCIA	ENSANCHE ACERA COLEGIO Y RENOV. DE AMBAS, CAPA RODADURA (SE PIERDEN PLAZAS)	JULIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE MADRE DE DIOS	VADOS COLEGIO	MEDIO
27	TUNEL CIRCULAR-SAN ISIDRO	MANTENIMIENTO VIGAS METÁLICAS (REVISIÓN, EMPOTRAMIENTOS Y RENOVACIÓN PINTURA)	JULIO	2 MESES	RODADA	CORTES ALTERNATIVOS CALZADAS	POR CALZADA OPUESTA (BY PASS)	BUS	ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
28	CALLEJÓN ALEGRÍA	REURBANIZACIÓN COMPLETA	AGOSTO	1 MES	PEATONAL	TOTAL	SIN DESVIO		BAJO
29	CALLEJÓN TORNEROS	PENDIENTE TRAS LA RESTAURACIÓN DE FACHADAS	AGOSTO	1 MES	PEATONAL	TOTAL	SIN DESVIO		BAJO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
30	PUENTE COLGANTE	RENOVACIÓN ACERA, PROLONGAR MEDIANA (TRAMO ESTACIÓN DE AUTOBUSES)	SEPTIEMBRE	1 MES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL ACERAS Y UN CARRIL	SIN DESVÍO	BUS ESTACIÓN AUTOBUSES	MEDIO
31	TRANSICIÓN	URBANIZACIÓN LADO PAR (OPUESTO A CUARTELES), DESDE ARCA REAL A Pº ARCO DE LADRILLO	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL ACERAS Y UN CARRIL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
32	EBRO	URBANIZACIÓN COMPLETA, ENSANCHE ACERAS, ACERA PROV. EN LADO VIUDAS	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE GENEFRAL SHELLY	VADOS	MEDIO
33	CARTAGENA	REURBANIZACIÓN COMPLETA CON ENSANCHE DE ACERAS... (EMBAJADORES - CAAMAÑO)	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLES ZAPADORES Y HORNIA	VADOS	MEDIO



34	ZAMORA	MODIFICAR/AÑADIR/DESDOBLAR 42 REBAJES PEAT. Y CICLISTAS APROB. EN PART. Y ASIG. C.M.U.	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y CARRIL BICI	CORTES PUNTUALES	SIN DESVIO		BAJO
35	ALCOHOLERA (DE LA)	ENSANCHE CON ACERAS (FALTA UNA) Y CALZADA DIFERENCIADAS (VALPARAÍSO - AV. ZAMORA)	SEPTIEMBRE	2 MESES	RODADA	CORTE CALZADA	POR CALLE GUARANIES Y CNO VIEJO SIMANCAS	VADOS	MEDIO
36	VENEZUELA	RENOVACIÓN DE ACERAS + CAPA RODADURA (METER RED AGUA)	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLES ECUADOR ARGENTINA Y CHILE	VADOS INSTITUTO PARADA BUS	MEDIO
37	NARANJO	SUSTITUCIÓN DE ADOQUINADO EN CALZADA POR AGLOMETADOO Y REBAJES DE PEATONES	SEPTIEMBRE	0,5 MESES	RODADA	CORTE CALZADA	POR CALLES POMELO Y CAÑADA REAL		MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
38	TENERÍAS	SUSTITUIR ESCALERAS POR RAMPAS	OCTUBRE	1 MES	PEATONAL	CORTE ACERA	POR RESTO PLAZA		BAJO
39	JUAN DE AUSTRIA (PLAZA)	ACERA LEVANTADA, DEL PUENTE J. AUSTRIA A EL CORTE INGÉS. REORDENAR CON P. Y J.	OCTUBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y UN CARRIL	POR PARQUE ANEXO	PUNTUALMENTE VADO DE EL CORTE INGÉS	MEDIO
40	ALCOHOLERA (DE LA)	CONSTRUCCIÓN DE ACERA ENTRE Nº 5 Y ATALAYA, SUPRIMIENDO LA OPUESTA Y DESPL. CALZADA	OCTUBRE 24	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERAS Y UN CARRIL	POR ACERA PARALELA	VADOS	MEDIO
41	ANETO (PARC. SIST. GRALES.)	DESESCOMBRO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HIDROSIEMBRA...	OCTUBRE	2 MESES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL ACERA	POR ACERA OPUESTA		BAJO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
42	ANTONIO ROYO VILLANOVA	REURBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE O CALLE + APARCAMIENTOS). MUY MAL ESTADO	NOVIEMBRE	5 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR ACERA OPUESTA Y AVDA MIGUEL ANGEL BLANCO	VADOS COLEGIOS	ALTO
43	ISTMO	URBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE EN TIERRAS DESDE EL NÚMERO 6)	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	BAJO
44	SANTA LUCÍA	APROVECHAMIENTO ESTACIONAMIENTO (CAMBIO DE LADO) DE LUIS BRAILLE A VERBENA	NOVIEMBRE	1 MES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y UN CARRIL	POR ACDERA OPUESTA	VADOS PARADA BUS	MEDIO
45	CAÑADA VALDESTILLAS	NUEVOS PASOS DE PEATONES Y PARADAS BUS + REPARACIONES VÍAS DE SERVICIO	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES ACERAS Y VÍA SERVICIO	SIN DESVIO	VADOS PARADA BUS	BAJO



	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
46	VALLE DE ARÁN	REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS RAÍCES, SUST. ÁRBOLES, OTROS EN PARTERRES	DICIEMBRE	4 MESES	PEATONAL	PARCIAL ACERAS	ACERA OPUESTA	VADOS	BAJO
47	PANORAMA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, SEGUNDO TRAMO, DE HAYA A ARENAS	DICIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	POR CALLE CONTIENDAS		MEDIO
48	LONDRES	REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS RAÍCES, SUST. ÁRBOLES, EN APARCAMIENTO	DICIEMBRE	3 MESES ^o	PEATONAL	CORTE ACERAS Y APARCAMI.	POR ACERA OPUESTA	RESIDENCIA ANCIANOS	MEDIO
49	TRADUCTORES	RENOV. PAVIMENTACIÓN OBSOLETA Y DAÑADA POR OBRAS. PLATAFORMA ÚNICA	DICIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	MEDIO
50	COBALTO	RENOVACIÓN - REORDENACIÓN ACERAS / TERRIZO / APARC. GALENA A PIRITA (ACERA SUR).	DICIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMI.	SIN DESVIO	VADOS , NAVES INDUSTRIALES PARADA BUS	ALTO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 2024 DEL AREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 9.875.000,00 euros

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS - PROGRAMACIÓN ABRIL-AGOSTO 2024

CALLE / VÍA PÚBLICA	TRABAJO	TRAMO	CRONOGRAMA INDICATIVO
NACIMIENTO	sellado de juntas	Completa	ABRIL
NOCHEBUENA	sellado de juntas	Completa	ABRIL
VILLANCICO	sellado de juntas	Completa	ABRIL
Pº ARCO LADRILLO	sellado de juntas	Nº 36 - Pº J.Carlos I	MAYO
VICTIMAS DEL TERRORISMO	sellado de juntas	Dulzaina - Ctra. Segovia	MAYO
LORENZO ARRAZOLA	sellado de juntas	Completa	MAYO
EDUARDO GARCIA BENITO	sellado de juntas	Completa	MAYO
ESLAVA	sellado de juntas	Nº 29 - Esperanza	MAYO
GOYA	sellado de juntas	Nº 43 - Esperanza	MAYO
ESTRELLA	sellado de juntas	Nº 36 - Esperanza	MAYO
LUNA	sellado de juntas	Irún - Esperanza	MAYO
DEL SOL	sellado de juntas	Completa	MAYO
AURORA	sellado de juntas	Irún - Esperanza	MAYO
Cº ESPERANZA	sellado de juntas	Velázquez - Crepúsculo	MAYO
ARCA REAL	sellado de juntas	Gral. Shelly - Farnesio	MAYO



PZA. DR QUEMADA II	sellado de juntas	Pº Zorrilla - Puente	MAYO
PUERTO RICO	sellado de juntas	Completa	MAYO
Pº FARNESIO	sellado de juntas	Nelson Mandela - Av. Segovia	MAYO-JUNIO
Pº ZORRILLA (CORTE INGLES)	sellado de juntas	Hípica - Turina + Intersección Hípica	JUNIO
MIRABEL	sellado de juntas	Soto-Tirso de Molina	JUNIO
Pº OBREGON	microaglomerado en frio	Tierra-Brezo	MAYO
Pº JARDIN BOTANICO	microaglomerado en frio	Tierra-Brezo	MAYO
NACIMIENTO	microaglomerado en frio	Completa	MAYO
NOCHEBUENA	microaglomerado en frio	Completa	MAYO
VILLANCICO	microaglomerado en frio	Completa	MAYO
PUENTE ISABEL LA CATOLICA	microaglomerado en frio	Sentido Isabel la Católica-M.A. Blanco	MAYO
MIGUEL ANGEL BLANCO	microaglomerado en frio	Arzobispo José Delicado - Av. Salamanca	MAYO
Pº ARCO LADRILLO	microaglomerado en frio	Nº 36 - Pº J.Carlos I	MAYO
VICTIMAS DEL TERRORISMO	microaglomerado en frio	Dulzaina - Ctra. Segovia	MAYO-JUNIO
LORENZO ARRAZOLA	microaglomerado en frio	Completa	MAYO-JUNIO
EDUARDO GARCIA BENITO	microaglomerado en frio	Completa	MAYO-JUNIO
ESLAVA	microaglomerado en frio	Nº 29 - Esperanza	MAYO-JUNIO
GOYA	microaglomerado en frio	Nº 43 - Esperanza	MAYO-JUNIO
ESTRELLA	microaglomerado en frio	Nº 36 - Esperanza	MAYO-JUNIO
LUNA	microaglomerado en frio	Irún - Esperanza	MAYO-JUNIO
DEL SOL	microaglomerado en frio	Completa	MAYO-JUNIO
AURORA	microaglomerado en frio	Irún - Esperanza	MAYO-JUNIO
Cº ESPERANZA	microaglomerado en frio	Velázquez - Crepúsculo	MAYO-JUNIO
ARCA REAL	microaglomerado en frio	Gral. Shelly - Farnesio	MAYO-JUNIO
PZA. DR QUEMADA II	microaglomerado en frio	Pº Zorrilla - Puente	MAYO-JUNIO
PUERTO RICO	microaglomerado en frio	Completa	MAYO-JUNIO
Pº FARNESIO	microaglomerado en frio	Nelson Mandela - Av. Segovia	MAYO-JUNIO
SANTIAGO ALBA	microaglomerado en frio	Tramo hasta curva	SIN CONCRETAR
CAPULETTI	microaglomerado en frio	Completa excepto zona aparcamiento	SIN CONCRETAR
CAÑADA FUENTE AMARGA	saneamiento y ensanche hasta 5,50 m + aglomerado sin fresado	Nº 28 - Puente Canal	ABRIL-MAYO
DULZAINA	fresado según zonas + aglomerado + anular rebajes sin paso	Víctimas del Terrorismo- VA-20	ABRIL
Pº FARNESIO	aglomerado 1 carril sentido Av. Sg - N.M.	Nelson Mandela - Av. Segovia	ABRIL
PZA. DR QUEMADA I	fresado + aglomerado	Puente - Pº Zorrilla	ABRIL
ANSELMO MIGUEL NIETO	fresado + aglomerado excepto lo renovado (70% aprox)	Completa excepto lo renovado (70%)	ABRIL
MANUEL MUCIENTES	fresado + aglomerado	Completa	ABRIL
SANTIAGO ALBA	fresado y aglomerado	Curva a acceso J. C. y L.	ABRIL
CAPULETTI	fresado y aglomerado	Aparcamiento + entradas	ABRIL-MAYO
LICENCIADO BELLOGUÍN	fresado + aglomerado	Completa	ABRIL-MAYO
VELAZQUEZ	fresado + aglomerado	Bretón - Montes y M. Baró	ABRIL-MAYO
PZA. CREPÚSCULO	fresado + aglomerado	Irún - Esperanto - Esperanza	ABRIL-MAYO



ARGALES	fresado + aglomerado	Completa	ABRIL-MAYO
GLORIA FUERTES	fresado + aglomerado	Puente Poniente - Av. Salamanca	ABRIL-MAYO
ARZOBISPO JOSE DELICADO	fresado + aglomerado	Completa	ABRIL-MAYO
FRANCESCO SCRIMIERI	fresado + aglomerado	Tramo junto A. J. Delicado	ABRIL-MAYO
PESETA	fresado + aglomerado	Completa	ABRIL-MAYO
Cº PALOMARES	ensanchar embocadura con aglomerado	Acceso desde J.C.I	MAYO
Cº ESPERANZA	fresado + aglomerado	Tramo final junto Crepúsculo	SIN CONCRETAR
TORTOLA	fresado + aglomerado	Cigüeña-J.C.I	MAYO
NUEVA DEL CARMEN	aglomerado+ malla	Nochevieja - Nochebuena	MAYO
TOPACIO II	fresado + aglomerado	Cobre - Plomo - hasta final	MAYO
ALAMILLOS	fresado + aglomerado	Prado Magdalena-Pólvora	JULIO
NICASIO PEREZ	fresado + aglomerado	Prado Magdalena-Pólvora	JULIO
CARDENAL MENDOZA	fresado + aglomerado	Reyes- Velardes	JULIO
JUAN MAMBRILLA	fresado + aglomerado	Cardenal Mendoza-Ruiz Hernández	JULIO
RUIZ HERNANDEZ	fresado + aglomerado	Juan Mambrilla-Librería	JULIO
PZA. STA.CRUZ	fresado + aglomerado	Completa	JULIO
LIBRERÍA	fresado + aglomerado	Ruiz Hernandez-Padre Arregui	JULIO
VELARDES	fresado + aglomerado	Huelgas-Cardenal Mendoza	JULIO
IMPERIAL	fresado + aglomerado	Pza. S. Nicolás-Lecheras	JULIO
CARDENAL TORQUEMADA	fresado + aglomerado	Pza. S. Pablo - Rondilla Sta Teresa	JULIO
LOPEZ GOMEZ	fresado + saneo varias zonas + aglomerado	Pza. Universidad-Pza. España	JULIO
AVDA ZAMORA	fresado + aglomerado	Avda. Madrid - Rotonda polígono	JULIO-AGOSTO
AVDA. SALAMANCA II	fresado + aglomerado	M.A.B. - Fco. Mendizábal	JULIO-AGOSTO
JOAQUIN VELASCO MARTIN	fresado + aglomerado	G. Fuertes - M.A.B + S. Arjona - F. Mendiz.	JULIO-AGOSTO
AVDA GIJON (CALZADA SENTIDO CENTRO)I	fresado borde carril dcho + aglomerado	Avda. Burgos - Enseñanza	JULIO-AGOSTO
AVDA GIJON (CALZADA SENTIDO CENTRO)II	fresado borde carril dcho + aglomerado	Enseñanza - A-62	JULIO-AGOSTO
ASUNCION	fresado + aglomerado (condicionada obra túnel)	Labradores-Padre Claret	JULIO-AGOSTO
DR. SANCHEZ VILLARES	fresado + aglomerado	Completa	JULIO-AGOSTO



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	PADRE CLARET - ANDALUCÍA	PASO BAJO LAS VÍAS PARA PEATONES Y BICICLETAS	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO		PEATONAL Y RODADA	TOTAL	ESTACIÓN ASUNCIÓN, GUIPÚZCOA S. VICENTE	VADOS	MEDIO
2	AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA (ENTRE DANIEL DEL OLMO Y AVENIDA DE ZAMORA)	REURBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE		PEATONAL Y RODADA	PARCIALES	SÍ	ACCESO COLEGIO INTERNACIONAL Y NUEVAS PARADAS DE BUS	ALTO
3	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM)	EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS.	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO		PEATONAL Y RODADA	PARCIALES	SÍ	BUS, COLEGIO LOS PINOSE INEA Y HUERTOS SITUADOS EN INEA	ALTO
4	TÚNEL DE LABRADORES	RENOVACIÓN DEL TÚNEL Y AMPLIACIÓN DE GÁLIBO	ABRIL	7 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	NO	BUS	ALTO
5	ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE FUENSALDAÑA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO ASFALTADO Y PINTURA.	OCTUBRE	12 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIALES	SIN DESVIO	BUS	MEDIO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE URBANISMO 29.934.451,51 euros

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE COMERCIO Y MERCADOS

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	TORRECILLA	ALUMBRADO, EMBELLECIMIENTO Y RENATURALIZACIÓN	JULIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE PARCIAL			BAJO
2	MANTERÍUA)	ALUMBRADO, EMBELLECIMIENTO Y RENATURALIZACIÓN	JULIO	3 MESES				CARA Y DESCARGA DURANTE INSTALACIÓN	BAJO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES DE COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO 600.000,00 euros



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL "AGUA DE VALLADOLID" (AQUAVALL)

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	Pº DEL CAUCE (ENTRE VALLE ESGUEVA Y AVDA SANTANDER)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	TOTAL			MEDIO
2	SANTANDER AVDA (ENTRE ALCARRIA Y COSTA BRAVA)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y REHABILITACIÓN COLECTOR	EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL UN SENTIDO	POR CMNO CEMENTERIO	BUS	ALTO
3	EMBAJADORES (ENTRE CARTAGENA Y GRAL SHELLEY)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS	AVDA SEGOVIA	VADOS C.I.F.P. JUAN DE HERREA. BUS	ALTO
4	NOGAL	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS		VADOS	ALTO
5	RAMÓN Y CAJAL	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA	OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL			ALTO
6	VILLABÁÑEZ (ENTRE CISNE Y JUAN CARLOS I)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA JULIO		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS	DESVÍOS POR TÚNEL DE CIRCULAR Y ANDRÓMEDA	AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO INCLUSO BUS.	ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
7	GONDOMAR	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	ABRIL	1,5 MESES	RODADA	OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL			BAJO
8	ECHEGARAY	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	ABRIL	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL	POR PZA PORTUGALETE	7	ALTO
9	ANTIGUA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	ABRIL	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL		AFECCIÓN AL BUS	ALTO
10	CHANCILLERÍA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	ABRIL	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS UN SENTIDO		AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO INCLUSO BUS.	ALTO
11	BRONCE	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	ABRIL	0,5 MESES	RODADA	OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL			BAJO



	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
12	ANGUSTIAS (ENTRE ECHEGARAY Y M. PICAWEA)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	MAYO	1,5 MESES	RODADA	CORTE PARCIAL CATAS EN CALZADA			ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
13	MACÍAS PICAWEA-CONDE ANSÚREZ	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	JUNIO	2 MESES	RODADA	CORTE TOTAL		VADOS	ALTO
14	FRANCISCO ZARANDONA	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	JUNIO	1 MES	PARCIALMENTE PEATONAL	NO			MEDIO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
15	GAMAZO	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	JULIO	5 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS	POR MURO Y DOS DE MAYO	VADOS, HOTEL, BUS	ALTO
16	ARCA REAL	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	JULIO	3 MESES	RODADA	CORTE TOTAL POR TRAMOS	EN FUNCIÓN DE LA ZONA A OCUPAR SE ESTUDIARÁN	VADOS, BUS	ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
17	AVDA SALAMANCA (ENTRE ERAS Y HDEZ PACHECO)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	OCTUBRE	2 MESES	RODADA	OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL		BUS	ALTO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
18	Avda Segovia (entre Túnel y Farnesio)	RENOVACIÓN ALCANTERILLADO	DICIEMBRE	2 MESES	RODADA	OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL		BUS	ALTO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES DE EPEL "AQUAVALL" 7.937.500,00 euros



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE VILLA DEL PRADO-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	PADRE JOSÉ ACOSTA	RED DE CALOR	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA PEATONAL	TOTAL	BYPASS	BUS	ALTO
2	MONASTERIO SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	RED DE CALOR	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA PEATONAL	TOTAL PARCIAL		VADOS, BUS	ALTO
3	MONASTERIO DE YUSTE CRUCE CON MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA	RED DE CALOR	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA	TOTAL PARCIAL	DESVÍO	VADOS, BUS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL ÁREA 1-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	MUNDIAL 82: AREA 1.1		EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA	PARCIAL		BUS, APARCAMIENTO, REAL VALLADOLID	ALTO
2	MUNDIAL 82: AREA 1.2		EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA	PARCIAL		BUS, APARCAMIENTO, REAL VALLADOLID	ALTO
3	MUNDIAL 82: AREA 1.3 (APARCAMIENTO C.C. M.D.)		ABRIL	1 MES	PEATONAL Y RODADA			APARCAMIENTO, FERIAS, R. VALLADOLID	ALTO
4	PADRE LLANOS AREA 1.8		ABRIL	1 MES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		CARREFOUR,	ALTO
5	REAL VALLADOLID: AREA 1.4		MAYO	1 MES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL TOTAL	BYPASS	BUS	ALTO
6	P. MIAJA DE LA MUELA-PADRE LLANOS: AREA 1.7		MAYO	1 MES	RODADA	TOTAL	BYPASS	BUS	ALTO
7	REAL VALLADOLID: AREA 1.5		JUNIO	1 MES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		CARREFOUR,	ALTO
8	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 1.6		JULIO	1 MES	RODADA	TOTAL	BYPASS		ALTO

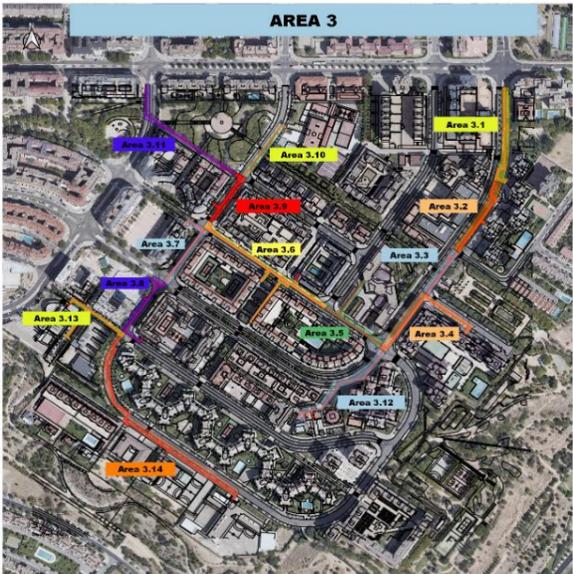


ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 2-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	CALLE JORGE VIDAL (PINTOR) : AREA 2.6		EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO		PEATONAL Y RODADA	TOTAL		CEIP I. MARTÍN BARÓ	ALTO
2	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 2.1		MAYO	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS	ALTO
3	P. MIAJA DE LA MUELA-HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.2		JULIO	2 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS	ALTO
4	CALLE HERNANDO DE ACUÑA : AREA 2.7		JULIO	1 MES	RODADA PEATONAL	PARCIAL			ALTO
5	CALLE CIUDAD DE LA HABANA : AREA 2.8		AGOSTO	1 MES	RODADA	PARCIAL			ALTO
6	CALLE JUAN DE VALLADOLID : AREA 2.9		SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		IES VADOS	ALTO
7	HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.3		SEPTIEMBRE	2 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
8	HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.4		NOVIEMBRE	2 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
9	CALLE ORIÓN: AREA 2.5		NOVIEMBRE	3 MESES	RODADA	TOTAL		AEMET	ALTO



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 3-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ: AREA 3.14		EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA	TOTAL		IES. CP.:	ALTO
2	CIUDAD DE LA HABANA (CENTRO SALUD Y C.C. PQ.): AREA 3.13		EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		PEATONAL	PARCIAL		C. CIVICO PQ.	ALTO
3	EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ: AREA 3.8		EN EJECUCIÓN HASTA MAYO		RODADA	TOTAL		VADOS	ALTO
4	MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-GARROTE TEBAR): AREA 3.7		ABRIL	1 MES	RODADA	PARCIAL		VADOS	ALTO
5	AMADEO ARIAS: AREA 3.6		MAYO	1 MES	RODADA	PARCIAL		VADOS	ALTO
6	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.1		AGOSTO	1 MES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO
7	AMADEO ARIAS: AREA 3.5		JUNIO	1 MES	RODADA	PARCIAL		VADOS	ALTO
8	P. MIAJA DE LA MUELA-GUZMAN EL PINCIANO: AREA 3.4		AGOSTO	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
9	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.2		SEPTIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO
10	JOSÉ GARROTE TÉBAR-PAPA LIMA: AREA 3.12		SEPTIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO
11	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.3		OCTUBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO
12	MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-JUAN M. VILLEGAS): AREA 3.9		OCTUBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO



13	MANUEL SILVELA (JUAN M. VILLERGAS-H. ACUÑA): AREA 3.10		NOVIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
14	MARTÍNEZ VILLERGAS-CDAD. HABANA: AREA 3.11		DICIEMBRE	1 MES	RODADA PEATONAL	PARCIAL TOTAL		VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 4-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	ENRIQUE CUBERO: AREA 4.10		OCTUBRE	4 MESES	RODADA	PARCIAL		POLICÍA, P. LALO Gª, CENTRO P. MAYORES	ALTO
2	JOSÉ GARROTE TÉBAR: AREA 4.1		NOVIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
3	MORELIA: AREA 4.9		NOVIEMBRE	2 MESES	RODADA	PARCIAL TOTAL		C.COMERCIAL PQ	ALTO
4	CIUDAD DE LA HABANA-AMADEO ARIAS: AREA 4.2		DICIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE 6-7-8.2 (LICITACIÓN)-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	CALLE MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y J. VELASCO MARTÍN FASE 6	RED DE CALOR	DICIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL	RODADA	BUS, VADOS	ALTO
2	AVDA. RAMÓN PRADERA-MARIANO GARCÍA ABRIL-TRILLA, AVDA. SALAMANCA FASE 7	RED DE CALOR	DICIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL TOTAL	RODADA	BUS, APARCAMIENTO DISUASORIO, CARRIL BICI, VADOS,	ALTO
3	CALLE SEMENTERA Y ERAS FASE 8.2	RED DE CALOR	DICIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL	RODADA	BUS,VADOS, IES E. FERRARI	ALTO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES DE LA RED DE CALOR "SOMACYL" 19.626.330,06 euros



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	CALLE CANAL	REURBANIZACIÓN DEL VIAL	EN EJECUCIÓN	DICIEMBRE	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO	LABORATORIO CHD ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS	BAJO

IMPORTE GLOBAL ESTIMADO (PEC CON IVA INCLUIDO) DEL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES DE CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO 3.368.574,36 euros
