




PLAN **RECONSTRUYE
VALLADOLID**

**PROGRAMACIÓN Y AFECCIONES DE OBRAS EN ESPACIO PUBLICO
ACTUALIZACIÓN ENERO 2026**

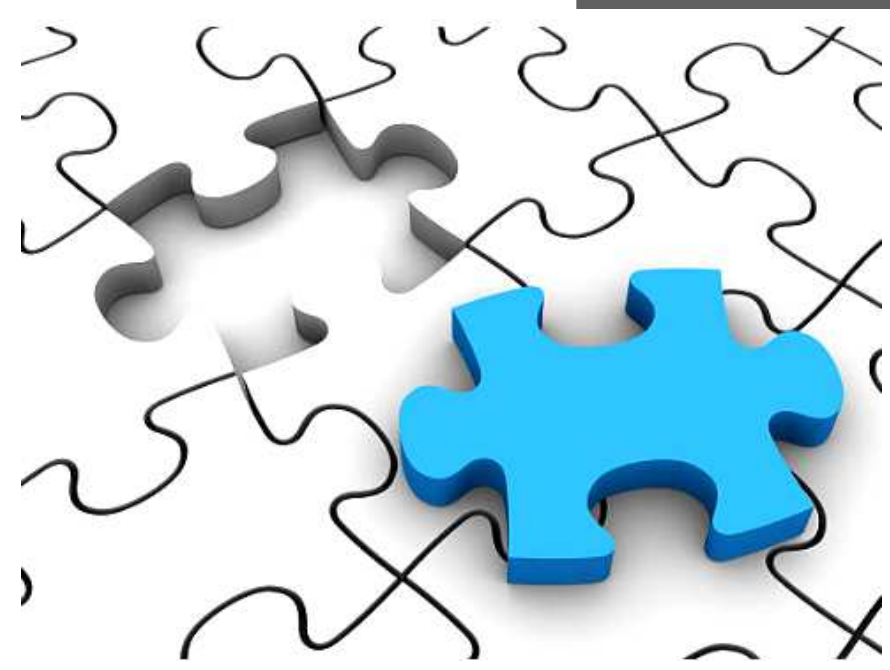

OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE

El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de programación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de cierta envergadura.

A tal fin, dicho instrumento contempla:

- Elaboración de un programa publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las menores molestias.
- Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña de conservación y renovación de asfaltado concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones de reurbanización en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)
- Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades económicas en general y los vecinos de las zonas en obras.
- Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados por las ejecuciones de las obras, ofreciendo información para proceder, en su caso, al trámite de quejas, sugerencias o reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

www.valladolid.es

CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

ENTIDAD	CANAL DE CONTACTO	
	teléfono	correo-e
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	010 983 100 105	iqs@ava.es
EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)	900 345 128	usuarios@aquavall.es
SOMACYL - RED DE CALOR-	983 362 888	acometidasredesdecalor@somacyl.es



RELACIÓN DE ACTUACIONES

TIPO DE ACTUACIÓN		NÚM DE ACTUACIONES PROGRAMADAS O EN CURSO A 31 DE ENERO DE 2026
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD		5 actuaciones
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD		47 actuaciones (incluyendo campaña reasfaltado)
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA		7 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR LA EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)		82 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)	-FASE PARQUESOL-	7 actuaciones
	-AMPLIACIÓN RED CALOR UVA-	4 actuaciones
	-ACOMETIDAS HR 50, HR 153 HR 157-	2 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO		1 actuación
TOTAL		155 actuaciones



ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL)	EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE	ABRIL	3 MESES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL SEÑALIZACIÓN			BAJO
2.	TOPACIO-AVDA SEGOVIA (POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL)	ACONDIONAMIENTO DE CAMPA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS	FEBRERO	5 MESES				ACCESOS AL RECINTO	BAJO
3.	SAN LUIS/ ACIBELAS	REURBANIZACIÓN	MAYO	12 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL		COMERCIOS VADOS	ALTO
4.	PUENTE DE PONIENTE Y ENTORNO	ADECUACIÓN DEL PUENTE DE PONIENTE Y ÁMBITOS ALEDAÑOS	EN ELABORACIÓN DE PROYECTO						
5.	VIADUCTO DANIEL DEL OLMO Y ENTORNO	ADECUACIÓN DEL VIADUCTO DE DANIEL DEL OLMO Y ÁMBITOS ALEDAÑOS	EN ELABORACIÓN DE PROYECTO						

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	VALLE DE ARÁN (2ª FASE)	REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS POR RAÍCES, CON PARTERRES LADO PAR	NOVIEMBRE 2025	FEBRERO	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES	POR ACERA OPUESTA	VADOS Y PARADAS BUS	BAJO
2.	ARCA REAL	REURBANIZACIÓN COMPLETA (A. LADRILLO – TRANSICIÓN) + RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	NOVIEMBRE 2025	MAYO	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR ACERAS OPUESTAS Y ARCO DE LADRILLO	VADOS, POLIDEPORTIVO, MERCADONA	ALTO
3.	ESTÍO	REURBANIZACIÓN COMPLETA, CON ACERAS Y SUST. ARBOLADO (AVELLANO – A. REAL)	NOVIEMBRE 2025	MARZO	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR CALZADA CENTRAL	VADOS	BAJO
4.	NARDO	REURBANIZACIÓN COMPLETA + RENOVACIÓN ABASTECIMOENTO	NOVIEMBRE 2025	FEBRERO	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
5.	PANERA	REURBANIZACIÓN COMPLETA (PRIMER TRAMO) + RENOVACIÓN ABASTECIMOENTO	NOVIEMBRE 2025	MARZO	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	POR PARVA DE LA RÍA	VADOS (SIN LEGALIZAR)	ALTO
6.	PLAZA DR. FLEMING	REURBANIZACIÓN ZONA INTERSECCIÓN CON PEATONALIZACIÓN + RENOV. ABASTECIMIENTO	NOVIEMBRE 2025	FEBRERO	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR RESTO PLAZA	NO	BAJO
7.	DR. FLEMING	REURBANIZACIÓN + RENOV. ABASTECIMIENTO (R. BURGOS – DR. MERCADO)	NOVIEMBRE 2025	ABRIL	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR ACERA OPUESTA	NO	MEDIO
8.	LA VÍA	REURB. ACERA + APARCAMIENTO Y MALLADO ABASTECIMIENTO (3 MANZANAS)	NOVIEMBRE 2025	FEBRERO	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
9.	Pº OBREGÓN (TIERRA – MADRESELVA)	REPARACIÓN COMPLETA DE ACERAS LADO PARCELA DEPORTIVA LEVANTADA RAÍCES Y PARTERRE PARA LOS ÁRBOLES	NOVIEMBRE 2025	MARZO	PEATONAL	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS, ACCESO APARCAMIENTO	BAJO
10.	INGENIERÍA	CARRIL BICI + RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS LEVANTADAS POR RAÍCES DE ÁRBOLES	FEBRERO	MAYO	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERAS Y APARCAMIENTO	POR ACERAS OPUESTAS	ACCESOS CAMPUS Y BUS	MEDIO
11.	VIDA	RECONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO LEVANTADO POR RAÍCES DE LOS ÁRBOLES	FEBRERO	MARZO	RODADA	CORTE APARCAMIENTOS	NO PRECISA	NO	BAJO
12.	AV. CONTIENDAS	RECONSTRUCCIÓN COMPLETA CALZADA DE SUBIDA (ORIENTAL A VELETA)	FEBRERO	ABRIL	RODADA	CORTE TOTAL CALZADA SUBIDA	CALZADA OPUESTA	VADOS Y LÍNEAS BUS	ALTO
13.	MIRLITÓN	REORDENACIÓN DE ACERAS, APARCAMIENTOS Y ALUMBRADO	FEBRERO	MAYO	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES CONTIGUOS	VADOS	MEDIO



14.	REQUINTO	REORDENACIÓN DE ACERAS, APARCAMIENTOS Y ALUMBRADO	FEBRERO	MAYO	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES CONTIGUOS	VADOS	MEDIO
15.	PALILLOS	REORDENACIÓN DE ACERAS, APARCAMIENTOS Y ALUMBRADO	FEBRERO	MAYO	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES CONTIGUOS	VADOS	MEDIO
16.	AV. SALAMANCA (JIMENEZ ALFARO - LÍMITE T.M.)	SUSTITUCIÓN DE ACERA LEVANTADA POR RAÍCES, POR PARTERRE TERRIZO	MARZO	ABRIL	PEATONAL Y CICLISTA	CORTE ACERA + CARRIL BICI	ACERA PARALELA Y VÍA SERVICIO	CARRIL BICI Y ACCESOS NAVES	MEDIO
17.	EUSEBIO GLEZ. SUÁREZ	RAMPAS DETRÁS CENTRO SALUD	MARZO	MAYO	PEATONAL	ITINERARIO PEATONAL	ACERAS VIALES CONTIGUOS	NO	BAJO
18.	NICARAGUA + PZA URUGUAY	RENOVACIÓN DE ACERAS	ABRIL	JULIO	PEATONAL Y RODADA	ACERAS Y PUNTUALMENTE CARRIL	POR ACERAS OPUESTAS	CABECERA BUS Y VADOS	MEDIO
19.	SAN QUIRCE / PZA. TRINIDAD	SUSTITUIR CALIZA DEGRADADA POR GRANITO EN FRENTE PLAZA	ABRIL	MAYO	PEATONAL	ACERA Y PUNTUALMENTE CARRIL	ACERA OPUESTA	NO	MEDIO
20.	VEGA Y HOSTIERO	REURBANIZACIÓN COMPLETA	MAYO	AGOSTO	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	ACERAS Y CALZADAS OPUESTAS	C Y D MERCADO CAMPILLO Y VADOS	ALTO
21.	PINGÜINO - TORDO	ACERA PERIMETRAL Y APARCAMIENTOS EN PARCELA LIBRE CONTIGUA	MAYO	AGOSTO	PEATONAL	PUNTUALMENTE ACERA	NO PRECISA	RESTO APARCAMIENTO	BAJO
22.	BÁLAGO	NUEVO APARCAMIENTO DISUASORIO	MAYO	AGOSTO	PEATONAL	APARCAMIENTO O PROVISIONAL	NO PRECISA	APARCAMIENTO PROVISIONAL	BAJO
23.	JUAN TEJEDOR LOZANO	RECONSTRUCCIÓN TRAMOS DE ACERAS Y SEMICALZADA HUNDIDAS	MAYO	JUNIO	PEATONAL Y RODADA	ACERA Y SEMICALZADA	VIALES CONTIGUOS	VADOS	BAJO
24.	PASARELAS CANAL DE CASTILLA	REPARACIÓN GENERAL DE LAS PASARELAS DE MADERA	MAYO	AGOSTO	PEATONAL	PASARELA PEATONAL	PASARELA MÁS PRÓXIMA	NO	MEDIO
25.	CAMINO MATABURRAS	COMPLETAR URBANIZACIÓN + APARCAMIENTO DISUASORIO	JUNIO	AGOSTO	PEATONAL Y RODADA	ACERA Y APARCAMIENTO O PROVISIONAL	NO PRECISA	PARQUE Y ENTORNO COLEGIO	BAJO
26.	Pº OBREGÓN (JUNTO COLEGIO)	NUEVO APARCAMIENTO DISUASORIO	JUNIO	AGOSTO	RODADA	APARCAMIENTO O PROVISIONAL	NO PRECISA	ENTORNO COLEGIO	BAJO
27.	SANTA LUCÍA	REORDENACIÓN Y MEJORA APARCAMIENTOS	JUNIO	AGOSTO	RODADA	CORTES PUNTUALES	VIALES CONTIGUOS	VADOS	MEDIO
28.	ZAPICO	REHACER FIRME CALZADA + RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JULIO	AGOSTO	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	ENTORNO CENTRO HISTÓRICO	ALTO



29.	PLAZA CARMEN (AV. SEGOVIA)	REURBANIZACIÓN Y ENSANCHE ACERA LADO IGLESIA	JULIO	SEPTIEMBRE	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR RESTO PLAZA	PARADA BUS, COLEGIO	MEDIO
30.	CAÑADA REAL	REHACER INTERSECCIONES ELEVADAS, PARADAS BUS, ETC. (Pº ZORRILLA A CEREZO)	JULIO	NOVIEMBRE	RODADA	CORTES POR TRAMOS	PASO ALTERNATIVO	VADOS, COLEGIO, BUS	MEDIO
31.	ANDARRÍOS	REPARACIÓN PAVIMENTOS, RELLENO DEL FOSO PARA AJARDINAR	JULIO	SEPTIEMBRE	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	VADOS	BAJO
32.	VIÑEDOS	URBANIZACIÓN COMPLETA EN PLATAFORMA ÚNICA DE CALLE EN TIERRAS	JULIO	OCTUBRE	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	BAJO
33.	RAMÓN PRADERA	RECONSTRUCCIÓN CON GRANDES PARTERRES DE PLACITA LEVANTADA POR RAÍCEES	JULIO	AGOSTO	PEATONAL	TOTAL	NO PRECISA	NO	BAJO
34.	CALLEJÓN DE LA ALCOHOLERA	REURBANIZACIÓN Y REORDENACIÓN CON NUEVA ACERA (DE ENSENADA A Cº VIEJO DE SIMANCAS)	AGOSTO	NOVIEMBRE	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	MEDIO
35.	TOVAR	REURBANIZAR EN PLATAFDORMA ÚNICA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	BAJO
36.	CARMELO – AV. SEGOVIA – Pº S. VICENTE	REURBANIZACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT URBANO CON AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PEATONALES.	AGOSTO	FEBRERO 2027	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	VADOS, COMERCIO CYD, BUS	MEDIO
37.	PALACIO	REURBANIZAR EN PLATAFDORMA ÚNICA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	BAJO
38.	ENSEÑANZA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, DE AV. GIJÓN A ARENAS	SEPTIEMBRE	MAR. 27	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	MEDIO
39.	MESÓN, ALFA, BETA	REURBANIZACIÓN DE VIALES EN PLATAFORMA ÚNICA	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	NO PRECISA	NO	BAJO
40.	VIVES	REURBANIZACIÓN COMPLETA	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	COLEGIO	MEDIO
41.	PASEO CAÑADA REAL	NUEVO PASEO AL SUR DE LA VA-30	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PEATONAL	ITINERARIO PEATONAL	NO PRECISA	NO	BAJO
42.	TIRSO DE MOLINA	REORDENACIÓN APARCAMIENTOS Y OREJAS MANTENIENDO ARBOLADO	OCTUBRE	DICIEMBRE	RODADA	CORTES PUNTUALES APARCAMIENTOS	NO PRECISA	VADOS	BAJO
43.	MONASTERIO Nª SRA. DE MONTSERRAT	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, PARTERRES Y SUSTITUCIONES DE ARBOLADO	OCTUBRE	ABRIL 20277	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	ACERAS OPUESTAS	VADOS	MEDIO



44.	HUELVA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, DE Pº SAN VICENTE A C/ CÁDIZ	NOVIEMBRE	ABRIL 2027	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	MEDIO
45.	AV. BURGOS	COMPLETAR LA ACERA DEL LADO PAR, DE ASTROS A LA GASOLINERA, REPARAR APARCAMIENTOS.	NOVIEMBRE	FEBRERO 2027	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES APARCAMIENTOS	NO PRECISA	VADOS NAVES INDUSTRIALES	BAJO
46.	ARMONIO	REPARACIÓN DE ACERAS LEVANTADAS POR LAS RAÍCES, SUSTITUCIÓN DE ÁRBOLES, PARTERRES	NOVIEMBRE	FEBRERO 2027	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES APARCAMIENTOS	NO PRECISA	VADOS	BAJO
47.	MÚLTIPLES ACTUACIONES EN TODA LA CIUDAD (1)	CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC)	ABRIL	APROX.6 MESES	RODADA	CORTES PUNTUALES CASO POR CASO	POR VIALES CONTIGUOS	DE TODO TIPO, CASO POR CASO	ALTO

(1) Nota: CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS - PROGRAMACIÓN NO DISPONIBLE HASTA MARZO / 2026



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM)	EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS.	EN CONTRATACIÓN HASTA ABRIL 2027		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SÍ	BUS, COLEGIO LOS PINOS, INEA Y HUERTOS SITUADOS EN INEA	ALTO
2.	ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE FUENSALDAÑA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO ASFALTADO Y PINTURA.	EN EJECUCIÓN HASTA NOVIEMBRE 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO
3.	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS ALTURA DE CALLE COSTA	OBRAS DE URBANIZACIÓN SECTOR 56-01	EN REDACCIÓN PROYECTO DESDE JUNIO 2026 20 MESES		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO
4.	LA CUMBRE, CALLES HAYA, QUEJIGO Y DE LA PALMA	OBRAS DE URBANIZACIÓN LA CUMBRE	EN CONTRATACIÓN DESDE MARZO 2026 6 MESES		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO
5.	29 DE OCTUBRE EN CALLE PAVO REAL	OBRAS DE URBANIZACIÓN 29 DE OCTUBRE	EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO
6.	HOSPITAL RONDILLA, CARDENAL TORQUEMADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN SECTOR ZAMBRANA (ZONA 1)	EN CONTRATACIÓN DESDE MARZO 2026 6 MESES		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO
7.	ZAMBRANA, AVENIDA DE SEGOVIA Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	OBRAS DE URBANIZACIÓN SECTOR ZAMBRANA (ZONA 2)	EN CONTRATACIÓN DESDE MARZO 2026 24 MESES		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR LA EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	AVDA. DE SANTANDER (ENTRE CORDILLERA Y ALCARRIA)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	ENERO	2 MESES	PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN ACERAS Y ZONA DE APARCAMIENTO	C/ TIERRA DEL PAN	CORTE PUNTUAL C/ ALCARRIA (1 SEMANA) ENTRE MARISMAS Y AVD. SANTANDER	BAJO
2	DOCTOR MORENO (DANIEL DEL OLMO A LICENCIADO BELLOGÍN)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	ENERO	5,5 MESES	RODADA	CORTE TOTAL	CTRA. RUEDA Y CALLE JOAQUÍN MARÍA JALÓN	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
3	ROSA CHACEL	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	ENERO	2 MESES	PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL, OCUPACIÓN ACERAS		VADOS; OCUPACIÓN PUNTUAL EN Pº SAN VICENTE (CONEXIÓN)	BAJO
4	MIRIAN BLASCO (ENTRE PADRE LLANOS Y HERNANDO DE ACUÑA)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	ENERO	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS	C/ PADRE LLANOS	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
5	DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ (ENTRE ARCA REAL Y VÁZQUEZ DE MENCHACA) 2 TRAMOS	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	ENERO	1 MES	RODADA	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA			MEDIO
6	ANDRÉS DE LA ORDEN ENTRE JUAN MAMBRILLA A FACULTAD DE MEDICINA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO	1 MES	PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL CALLE FACULTAD DE MEDICINA. MUY PUNTUAL	AVENIDA RAMÓN CAJAL Y	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
7	COSTANILLA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO		RODADA	CORTE TOTAL. MUY PUNTUAL	SUBIDA FUENTE EL SOL	VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO Y A PARADA DE BUS.	BAJO
8	MINUTISA ENTRE LOTO Y VILLABÁÑEZ	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO		RODADA	CORTE TOTAL. MUY PUNTUAL		VADOS.	BAJO
9	PADRE MANJÓN DE CARMELO A DELICIAS	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO		RODADA	CORTE TOTAL CALLE PADRE MANJÓN (ENTRE OLMEDO Y CARMELO) Y CALLE DELICIAS (ENTRE SAN JOSÉ DE CALASANZ Y MARIANO JOSÉ LARA) MUY PUNTUAL	CALLE OLMEDO	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
10	PADRE MANJÓN DE OLMEDO A DELICIAS	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO		RODADA	CORTE TOTAL CALLE PADRE MANJÓN (ENTRE OLMEDO Y CARMELO) Y CALLE DELICIAS (ENTRE SAN JOSÉ DE CALASANZ Y MARIANO JOSÉ	CALLE OLMEDO	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO



						LARA) PUNTUAL	MUY		
11	SAN LÁZARO DE FUENTE EL SOL A VICTORIA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO		RODADA	CORTE TOTA	CALLE SAN SEBASTIÁN	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
12	SAN LÁZARO DE VILLANUBLA A JÚPITER	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ENERO		RODADA	CORTE TOTAL	CALLE NEPTUNO	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
13	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES PÚBLICAS (325 PUNTOS POR TODA LA CIUDAD)	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES	ENERO	12 MESES	325 FUENTES EN ACERAS Y PARQUES				BAJO
	SECTORIZACIÓN	EJECUCIÓN DE ARQUETAS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS LOCALIZADOS DE LA CIUDAD							
14	AV PALENCIA CV PS DEL CAUCE		ENERO		ACERA Y APARCAMIENTO				BAJO
15	AV BURGOS TRAS GASOLINERA PUENTE MAYOR		ENERO		PEATONAL				BAJO
16	AV DEL EURO		ENERO		ACERA Y APARCAMIENTO				BAJO
17	C/ SANTA FE		ENERO		ACERA Y CALZADA	PARCIAL			BAJO
18	Pº JARDÍN BOTÁNICO		ENERO	1 MES	ACERA Y APARCAMIENTO				BAJO
19	C/ ABEJARUCO CV C/ CARBONERO		ENERO		CALZADA Y ACERA	PARCIAL			BAJO
20	Pº JUAN CARLOS I CV C/ FERNANDO FERREIRO		ENERO		APARCAMIENTO				BAJO
21	PS ZORRILLA CV C/ DANIEL DEL OLMO		ENERO		CALZADA	AFECCIÓN TRÁFICO ZORRILLA (FRENTE MATADERO)	A Pº		ALTO
22	Pº CAUCE CV NOCHE VIEJA		ENERO	2 MESES	CALZADA	CORTE TOTAL DEL CAUCE	Pº SÍ		ALTO



23	C/ ERAS CV RAMÓN PRADERA		ENERO		ACERA Y JARDÍN				BAJO
24	Pº ZORRILLA CV TURINA		ENERO		ACERA				BAJO
25	CALLE DE LA INDIA		ENERO		ACERA CALZADA COEXISTENCIA				BAJO
	MOTORIZACIÓN VÁLVULAS ANILLO 1000	ACTUACIONES PUNTUALES EN LAS SIGUIENTES ZONAS DE LA CIUDAD	ENERO	4 MESES					
26	CALLE Mº SAN LORENZO DEL ESCORIAL CV CALLE Mº DE YUSTE		ENERO		ACERA Y MEDIANA				BAJO
27	PZ DE LAS CORTES CASTILLA Y LEÓN		ENERO		PARQUE				BAJO
28	AV SALAMANCA CV MEDINA DEL CAMPO		ENERO		ACERA				BAJO
29	AV ZAMORA C/V CÑDA REAL		ENERO		ACERA				BAJO
30	AV ZAMORA C/V CTRA RUEDA		ENERO		ACERA				BAJO
31	AV ZAMORA C/V VÁZQUEZ DE MENCHACA		ENERO		ACERA Y CALZADA	CRUCE CALZADA A EXPENSAS DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR CANALIZACIONES DE ALUMBRADO EXISTENTES			MEDIO
32	CTRA MADRID CV PS JUAN CARLOS I		ENERO		ACERA Y CALZADA	CRUCE CALZADA A EXPENSAS DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR CANALIZACIONES DE ALUMBRADO EXISTENTES			MEDIO
33	PS JUAN CARLOS I CV BENITO MENNI		ENERO		ACERA Y CALZADA	CORTE PARCIAL CALZADA C/ EMBAJADORES CV Pª JC I			MEDIO
34	PS JUAN CARLOS I CV AV SEGOVIA		ENERO		ACERA				BAJO



35	PS JUAN CARLOS I CV CELTAS CORTOS		ENERO		ACERA				BAJO
36	CL CANTERAC (ERMITA SAN ISIDRO)		ENERO		ACERA Y CALZADA	CORTE PARCIAL CALZADA AL FINAL DE APARCAMIENTO			MEDIO
37	PS JUAN CARLOS I CV PS SAN ISIDRO		ENERO		ACERA Y MEDIANA				BAJO
38	PS JUAN CARLO I CV CL VILLABÁÑEZ		ENERO		ACERA Y CALZADA	CRUCE CALZADA A EXPENSAS DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR CANALIZACIONES DE ALUMBRADO EXISTENTES			MEDIO
39	PS JUAN CARLOS I CV PS DEL CAUCE		ENERO		ACERA				BAJO
40	PS DEL CAUCE CV GABRIEL Y GALÁN		ENERO		ACERA				BAJO
41	PS DEL CAUCE CV AV VALLE ESGUEVA		ENERO		ACERA				BAJO
42	PS DEL CAUCE CV SIGLO DE ORO		ENERO		ACERA Y CALZADA	CORTE TOTAL DE Pº DEL CAUCE ENTRE AV PALENCIA Y SIGLO DE ORO PUNTUAL			ALTO
43	PZ RIBERA DE CASTILLA		ENERO		ACERA				BAJO
44	AV BURGOS (PUENTE MAYOR)		ENERO		ACERA				BAJO
45	DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ (ENTRE VÁZQUEZ DE MENCHACA Y CRUCE FF.CC)	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	FEBRERO	3 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
46	ZARAGOZA Y CAUCE, Pº DEL (ENTRE VÍA Y GABRIEL Y GALÁN)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	FEBRERO	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS			MEDIO
47	ELÍPTICA, BREVE Y CONCORDIA	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	FEBRERO	4 MESES	RODADA	CORTE TOTAL POR TRAMOS	C/ BREVE Y C/ CONCORDIA	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO



48	SAN LÁZARO VILLANUBLA A MONJAS	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	FEBRERO	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL. MUY PUNTUAL	CALLE NEPTUNO	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
49	ZARAGOZA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	FEBRERO		RODADA	CORTE TOTAL, OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN EN PASEO DEL CAUCE. MUY PUNTUAL	CALLE LA VÍA	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
50	VALDESTILLAS, CAÑADA. PARES	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	FEBRERO		RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
51	VALDESTILLAS, CAÑADA. IMPARES	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	FEBRERO		RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
52	PÁRAMO DE SAN ISIDRO ENTRE STA M ^a DE LA CABEZA Y CMNO LAGAR DE HOYOS	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	MARZO	1 MES	RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	BAJO
53	PÁRAMO DE SAN ISIDRO ENTRE STA M ^a DE LA CABEZA Y J. CARLOS I	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	MARZO		RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	BAJO
54	DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ (ENTRE CRUCE FF.CC Y P ^o ZORRILLA)	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	ABRIL	2 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
55	CAAMAÑO (ENTRE PADRE BENITO MENNI Y CABALLERÍA)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	ABRIL	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS UN SENTIDO		AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO INCLUSO BUS.	ALTO
56	PINGÜINO ENTRE CIGÜEÑA Y JUAN CARLOS I	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ABRIL	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL CALLE PINGÜINO (ENTRE JUAN CARLOS I Y CIGÜEÑA); OCUPACIÓN INTERSECCIÓN ENTRE CIGÜEÑA Y PINGÜINO. MUY PUNTUAL	CALLE VILABÁÑEZ	VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	MEDIO
57	SALUD ENTRE P ^o DEL CAUCE Y PTE LA REINA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	ABRIL		RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
58	EUSEBIO GLEZ SUÁREZ DESDE OVOIDE A N ^o 33 POR PARQUE	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	MAYO	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN ZONA DE APARCAMIENTO Y ZONA DE ACERAS		VADOS.	BAJO
59	EUSEBIO GLEZ SUÁREZ RESTO CALLE NO REHABILITADA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	MAYO		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN ZONA DE APARCAMIENTO Y ZONA DE ACERAS		VADOS.	BAJO



60	HOSPITAL MILITAR ENTRE ARCO LADRILLO Y DUQUE DE ZARAGOZA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JUNIO	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y ZONA DE ACERAS		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS	BAJO
61	NORTE ENTRE TOREROS Y GABILONDO	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JUNIO		RODADO	CORTE CALLE NORTE (ENTRE GABILONDO Y TOREROS); CORTE CALLE GABILONDO (ENTRE NORTE Y DOMINGO MARTÍNEZ); CORTE CALLE TOREROS (ENTRE NORTE Y PERAL) (POR TRAMOS)		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
62	TAJAHIERRO	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JUNIO		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CALLE TAJAHIERRO (ENTRE AV. DE LOS RECREOS Y CALLE DEL HOGAR)		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
63	NORTE (ENTRE TOREROS Y GABILONDO)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JUNIO	2 MESES	RODADA	CORTE TOTAL	C/ DOMINGO MARTÍNEZ	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
64	RONDILLA DE SANTA TERESA (DE GONDOMAR A MIRABEL) IMPARES	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JUNIO	5 MESES	PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y ZONA DE APARCAMIENTO		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	MEDIO
65	CTRA DE RUEDA (ENTRE CALLE FINAL Y J.Mª JALÓN)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JUNIO	5 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL	C/ DOCTOR MORENO Y C/ DEL FINAL	VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	ALTO
66	AVDA DE BURGOS M.D. ENTRE RONDA NORTE Y CALLE PESETA	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	JUNIO	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
67	CROMO DE MAGNESIO A KRIPTÓN. PARES	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JULIO	1 MES	PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN ZONA DE APARCAMIENTO		VADOS (NAVES SAN POLÍGONO CRISTÓBAL).	BAJO
68	KRIPTÓN, ENTRE ALUMINIO Y Nº 19. LADO IMPARES	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JULIO		PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN ZONA DE APARCAMIENTO		VADOS (NAVES SAN POLÍGONO CRISTÓBAL).	BAJO
69	IMPERIAL ENTRE LECHERAS E ISABEL LA CATÓLICA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JULIO		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE CALLE LECHERAS (ENTRE IMPERIAL Y TAHONAS); OCUPACIÓN INTERSECCIÓN		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS	ALTO



						PLAZA SAN NICOLÁS Y PASEO ISABEL LA CATÓLICA. MUY PUNTUAL			
70	MANTILLA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JULIO		RODADA	CORTE TOTAL CALLE MANTILLA; OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CALLE MARINA ESCOBAR MUY PUNTUAL		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
71	MANUEL LÓPEZ ANTOLÍ ENTRE COMUNEROS Y DÁRSENA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO		RODADA	CORTE TOTAL CALLE MANUEL LÓPEZ ANTOLÍ (ENTRE COMUNEROS Y DÁRSENA) MUY PUNTUAL		AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
72	MARINA ESCOBAR	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO		RODADA	CORTE TOTAL CALLE MARINA ESCOBAR MUY PUNTUAL		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	ALTO
73	PAULINA HARRIET (ENTRE J DE JUNI Y G FDEZ)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	AGOSTO	2 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL	C/ JUAN DE JUNI Y C/ GREGORIO FERNÁNDEZ.	VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
74	ZAPADORES	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	AGOSTO	3 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS (INTERSECCIÓN CON C/ GABRIEL Y GALÁN.	ALTO
75	JUAN DE HERRERA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y ZONA DE APARCAMIENTO		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
76	ZAPARDIEL	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO		RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y ZONA DE APARCAMIENTO		VADOS.	MEDIO
77	JUAN DE HERRERA, PRAVES Y ESTEBAN JORDÁN	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	3 MESES	RODADA	CORTE TOTAL POR TRAMOS	PASEO JUAN DE AUSTRIA	VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO. CENTRO EDUCACIÓN PARA ADULTOS "FELIPE II".	MEDIO
78	JUAN GARCÍA HORTELANO	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	4 MESES	RODADA	OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL		BUS	MEDIO
79	DÁRSENA (ENTRE SATURNO Y FUENTE EL SOL)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	3 MESES	RODADA	CORTE TOTAL POR TRAMOS	EN FUNCIÓN DE LA ZONA A OCUPAR SE ESTUDIARÁN LAS	VADOS, BUS	ALTO




							ALTERNATIVAS		
80	ZAPARDIEL	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	OCTUBRE	2 MESES	RODADA	OCUPACIONES EN UN CARRIL			MEDIO
81	AVDA DE BURGOS M.D. ENTRE CALLE PESETA Y ASTROS	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	OCTUBRE	2 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
82	CAMINO TINTO-PROLONGACIÓN C/ FUENTES	BOMBEO E IMPULSIÓN RESIDUALES A TANQUE DE TORMENTAS	PENDIENTE DE PERMISO DE LA CHD	8 MESES					BAJO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL -

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVIO		
1.1	JUAN GARCÍA HORTELANO Y CIUDAD DE LA HABANA HASTA MANUEL AZAÑA		SEPTIEMBRE 2025	2 MESES	RODADA	PARCIAL	EJECUTADO HASTA RODADURA PROVISIONAL. ABIERTA AL TRÁFICO	BUS, VADOS	ALTO
1.2	HERNANDO DE ACUÑA		NOVIEMBRE 2025	4 MESES	RODADA	PARCIAL	EN EJECUCIÓN CIRCULACIÓN HABILITADA EN DOBLE SENTIDO CARRIL Nº PARES E IMPARES ACCESO A VADOS	BUS, VADOS	ALTO
1.3	JOSÉ GARROTE TEBAR Y FEDERICO LANDROVE MOIÑO		ABRIL	2 MESES	RODADA	PARCIAL	EJECUTADO HASTA RODADURA PROVISIONAL. ABIERTA AL TRÁFICO	BUS, VADOS	ALTO
1.4	MANUEL AZAÑA		ENERO	5 MESES	RODADA	PARCIAL	EN EJECUCIÓN CIRCULACIÓN HABILITADA EN DOBLE SENTIDO CARRIL Nº PARES	BUS, VADOS	ALTO
2.1	JOSÉ GARROTE TEBAR Y CIUDAD DE LA HABANA		AGOSTO 25	1 MESES	RODADA	PARCIAL	EJECUTADO HASTA RODADURA PROVISIONAL. ABIERTA AL TRÁFICO	BUS, VADOS	ALTO
2.2	ENRIQUE CUBERO CALLE MORELIA			3 MESES	RODADA	PARCIAL	SIN INICIAR	BUS, VADOS	ALTO
2.3	ENRIQUE CUBERO		MARZO 26	4 MESES	RODADA	PARCIAL	EN EJECUCIÓN (DESDE CDAD. HABANA HASTA Nº 8)	BUS, VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -AMPLIACIÓN RED DE CALOR UVA-

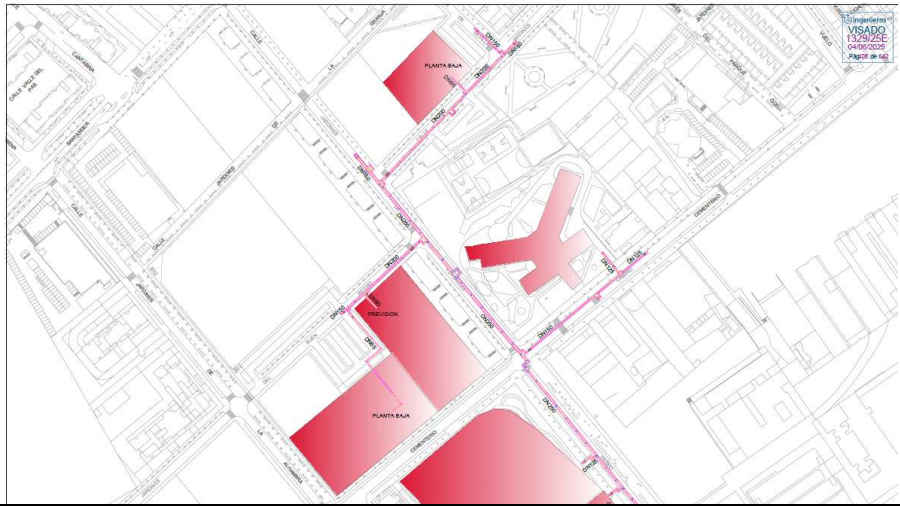	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVIO		
1.1	PASEO DE BELÉN (ZONA UVA)		SEPTIEMBRE 2025	4 MESES	RODADA	PARCIAL	FINALIZADO A FALTA DE ADOQUÍN EN APARCAMIENTO Y ABIERTA ZANJA PARA	BUS, VADOS	ALTO
1.2	JARDINES DE VERSALLES (ZONA CENTRO DE SALUD)		ENERO	2 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.3	JARDINES DEL BUEN RETIRO		ENERO	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.45	CALLE JARDINES DE SABATINI		DICIEMBRE 2025	4 MESES	RODADA	PARCIAL	FINALIZADO. ABIERTO SOLO PARA ENTRONCAR CON JARDINES DE VERSALLES	BUS, VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -ACOMETIDAS HR 50, HR 153 Y HR 157-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVIO		
1.1	HR 50 GLORIA FUERTES DESDE ARZOBISPO JOSÉ DELICADO		SEPTIEMBRE	1,5 MESES	RODADA	PARCIAL	FINALIZADO A FALTA DE PINTURA EN CARRIL BICI Y ASFALTADO	BUS, VADOS	ALTO
1.2	HR 153 ACOMETIDA A VIVIENDAS PROTEGIDAS SOMACYL CALLE MIESES		SEPTIEMBRE	1,5 MESES	RODADA	PARCIAL	FINALIZADO A FALTA DE ASFALTADO	BUS, VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CALLE CANAL	URBANIZACIÓN DEL VIAL EN PROLONGACIÓN HASTA CRA FUENSALDAÑA	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2026		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	LABORATORIO CHD	BAJO
